

PLANIMETRIA GENERALE

1. ORGANIZZAZIONE ED ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Tipologia: A. PREPARAZIONE AREA DI LAVORO

Descrizione: II. BONIFICA TERRENO ESECUZIONE RECINZIONE ESECUZIONE E DELIMITAZIONE VISIBILITA' INTERNA AL CANTIERE

Modalità di esecuzione: Provvedere a stabilire una delimitazione dell'area di cantiere, recinzione con barriere mobili e stabile un percorso di massima per gli addetti ed i mezzi meccanici. Tutte le lavorazioni effettuate devono comunque consentire di non lasciare situazioni di pericolo durante le ore di inattività del cantiere, avendo cura di esporre idonea segnaletica inerente la visibilità, menara ed esterna al cantiere stesso e le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare. La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al D.Lgs. 493/96. Identificare quindi le zone di installazione dei baracamenti e preparare il terreno provvedendo ad una bonifica del terreno e ad eliminare il fessaggio delle acque meteoriche segnalando opportunamente buche, sporgenza ed ostacoli fissi presenti nell'area di cantiere.

Interconnessioni con altri lavori: In questa prima fase di allestimento del cantiere non si prevedono interconnessioni significative con altre lavorazioni

Attrezzature e macchinari: Mazza, piccola pala Materiali: Palletti di legno o metallici, travi, tavole, rete


Analisi dei rischi: Sono possibili lesioni e commosioni per l'uso della mazza, dei piccone e della pala, un' dovuta alla movimentazione delle travi e degli assi, pericoli di caduta del materiale con conseguente schiacciamento

Misure provvisoriai: Allestire percorsi chiaramente segnalati e distinti per gli automezzi e gli uomini predisponendo barriere amovibili con larghezza non inferiore a m.0,5 per il transito di uomini ed a m. 1,20 per i mezzi o il trasporto dei materiali. Tutte le zone prospicienti il vuoto (distante superiore a m.0,5) devono essere protette con parapetto solido o mezzi equivalenti. I lavoratori devono segnalare immediatamente al capocantiere e agli assistenti qualsiasi anomalia riscontrata rispetto ai mezzi ed alle attrezzature utilizzate. In caso di dubbi o difficoltà escutibile dalle stesse sedi lavorative. I lavoratori non devono effettuare azioni che possano compromettere la propria sicurezza e quella degli altri lavoratori. Alloggiamento, dell'area di cantiere individuali, di persone e cose che possono interferire le normali operazioni di installazione.

Dispositivi di protezione individuali: Casco, guanti, calzature di sicurezza

Riferimenti normati: D.Lgs 493/96; D.Lgs 626/94; Insegna con D.Lgs 242/96; D.Lgs 277/91; D.Lgs 81/08

Note: L'accesso nell'area di cantiere non deve essere permesso alle persone estranee alle lavorazioni. L'elvezza della cesata deve essere non minore a quella richiesta dal locale regolamento edilizio. Segnalare tempestivamente gli ingorghi sulla strada, con segnaletica di illuminazione conforme a quanto richiesto dal regolamento edilizio e dal codice della strada. In luogo di facile consultazione esporre un cartello con indicazione dei numeri telefonici del più vicino comando dei Vigili del Fuoco, delle ambulanze e in generale degli enti da interpellare in caso di emergenza

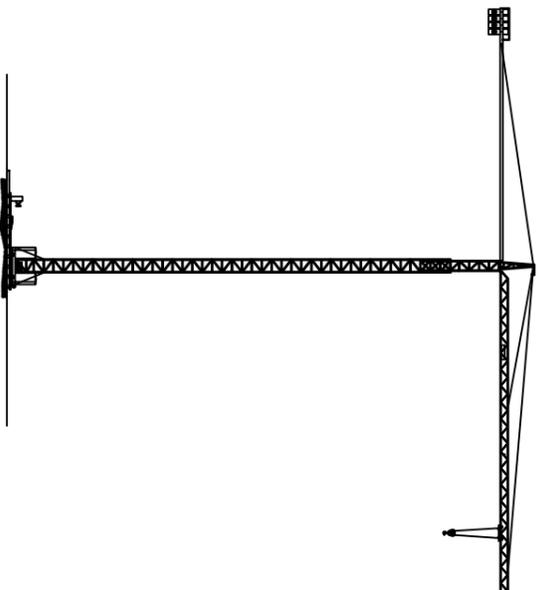

cartelli di cantiere

VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI
La ditta non risponde di eventuali danni a persone o cose

MASSICCI CARICHI SOVRARI
ATTENZIONE: PERICOLO DI CADUTA MATERIALI

ATTENZIONE: CAOVITA' MATERIALI
CAOVITA' MATERIALI

ESPOSIZIONE A RUMORI E VIBRAZIONI
ESPOSIZIONE A RUMORI E VIBRAZIONI

E' OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO

MASSICCI CARICHI SOVRARI
ATTENZIONE: PERICOLO DI CADUTA MATERIALI

ATTENZIONE: CAOVITA' MATERIALI
CAOVITA' MATERIALI

ESPOSIZIONE A RUMORI E VIBRAZIONI
ESPOSIZIONE A RUMORI E VIBRAZIONI
